

ประวัติสถานี

สถานีสำรวจอุทกวิทยาแม่น้ำยม (Y.17)

อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง

สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ

มกราคม พ.ศ.2569

ประวัติสถานี Y.17

1. ที่ตั้ง

แม่น้ำ ยม บ้าน สามง่าม ตำบล สามง่าม

อำเภอ สามง่าม จังหวัด พิจิตร

พิกัด

LAT 16.507438 LONG 100.204084

UTM 1825450 N 628505 E

พื้นที่รับน้ำ 21,717.18 ตารางกิโลเมตร

ความยาวจากต้นน้ำถึงสถานีสำรวจ กิโลเมตร


เปิดเพื่อจุดประสงค์

☐ พัฒนาแหล่งน้ำ ☑ บริหารจัดการน้ำ


☐ เตือนภัยน้ำท่วม ☐ งานวิจัยลุ่มน้ำ

กำหนดที่ตั้งหน่วยสำรวจโดย ตำแหน่ง

เมื่อ พ.ศ.

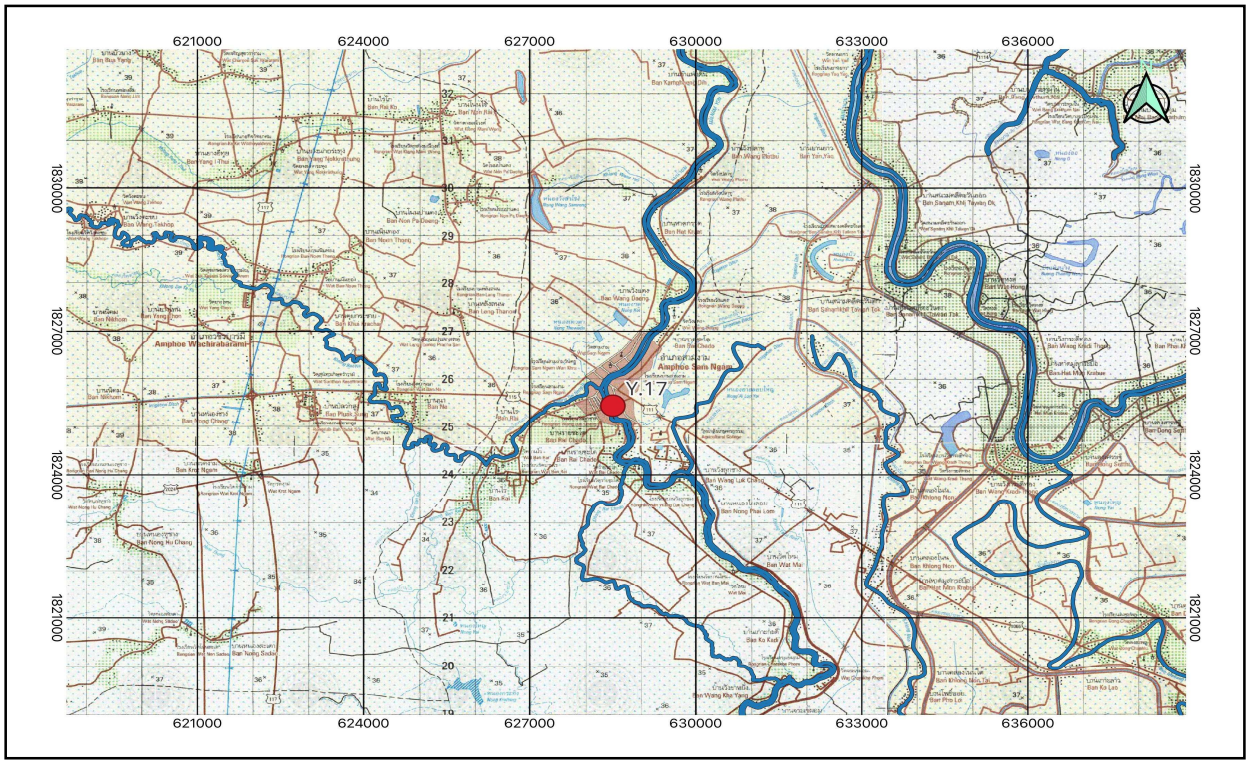


แผนที่ 1 : 50,000 แสดงที่ตั้งสถานี

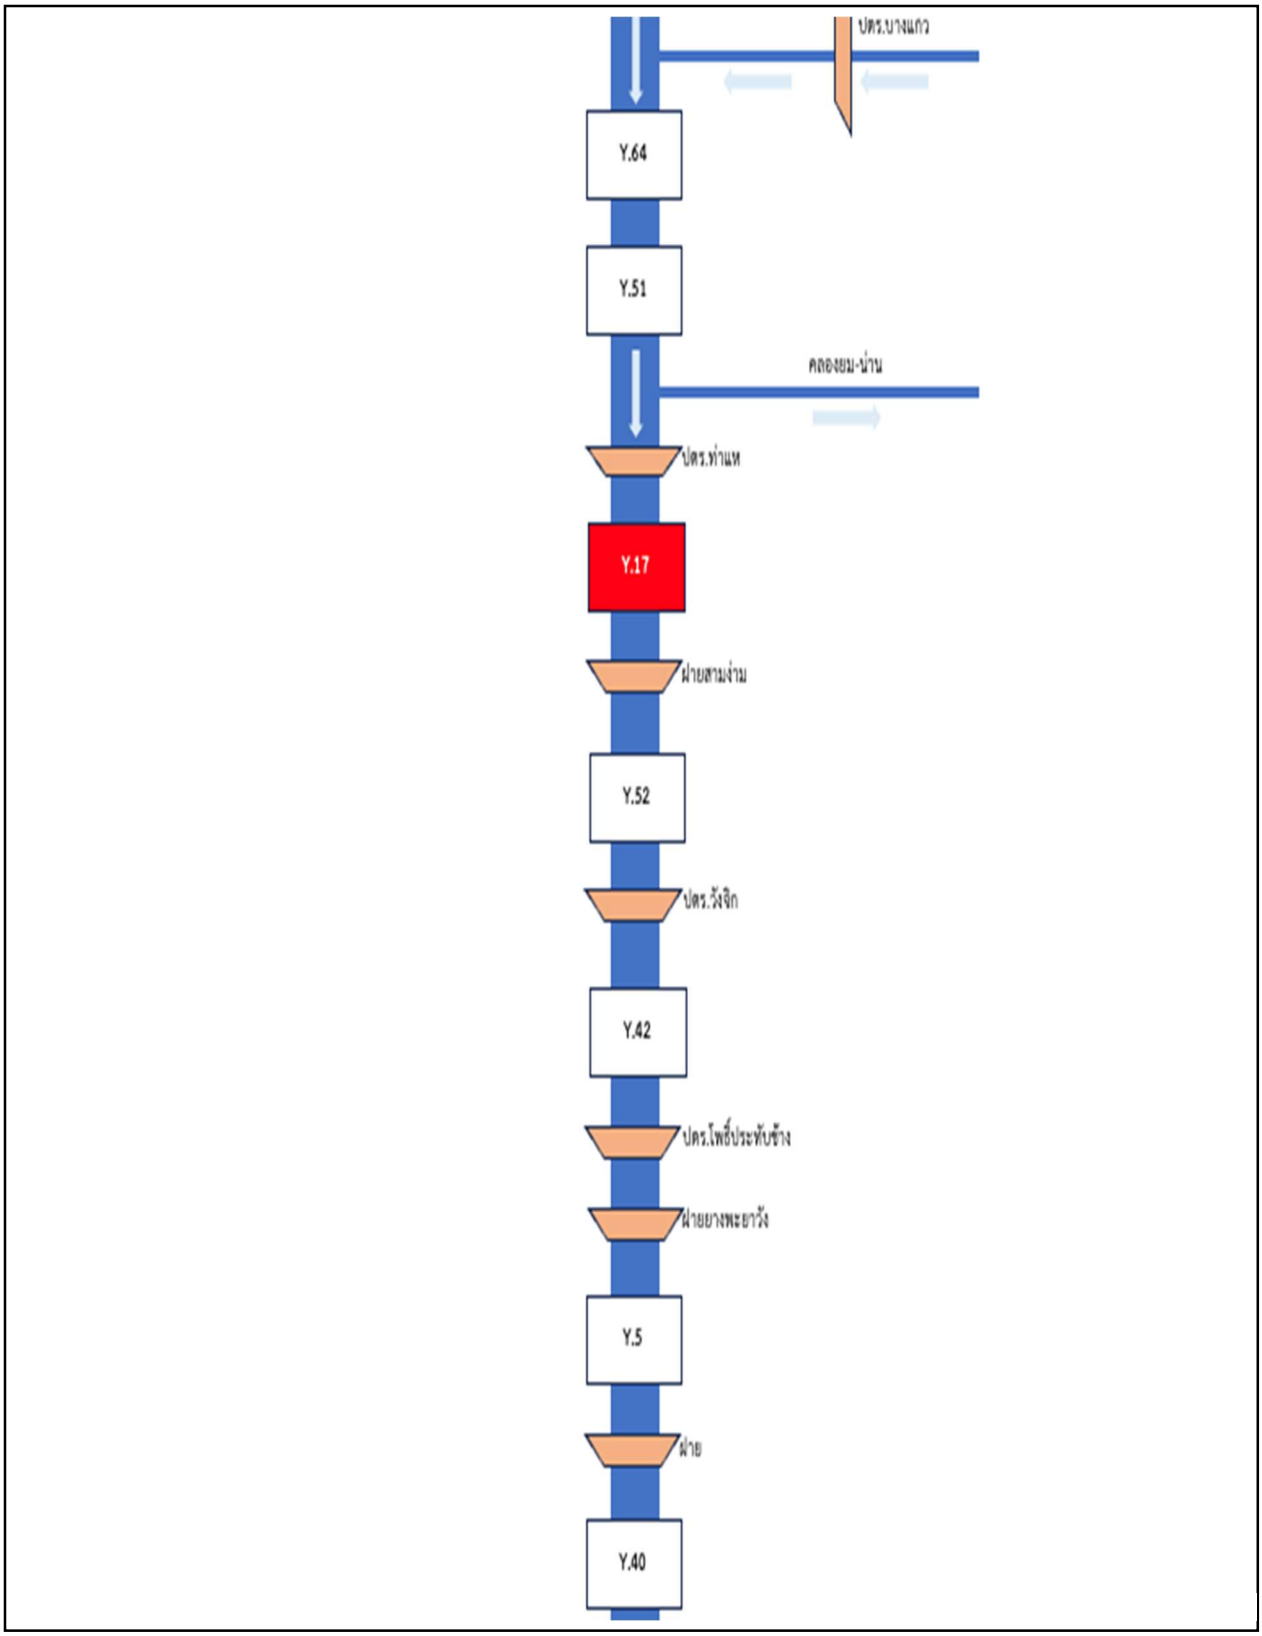

แผนผังแสดงลำน้ำยม สถานี Y.17

แผนที่การเดินทางจากศูนย์ฯ ไปยังสถานี

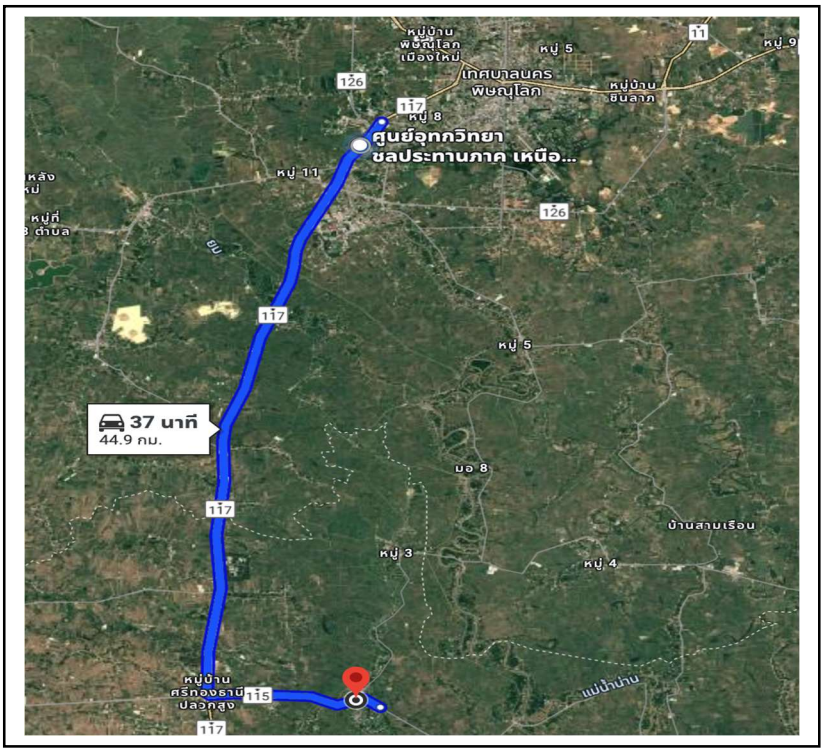

2. ลักษณะภูมิประเทศ ☑ ที่ราบลุ่ม ☐ ที่ราบเชิงเขา ☐ ทุ่งนา ☐ ภูเขา

3. ลักษณะลำน้ำ

เหนือแนวสำรวจ ลักษณะลำน้ำ ประมาณ เมตร

ท้ายแนวสำรวจ ลักษณะลำน้ำ ประมาณ เมตร



ลักษณะลำน้ำบริเวณสถานี

4. ลักษณท้องน้ำ ☐ กรวด ☐ หิน ☑ ทราย

5. รูปร่างลำน้ำเป็นรูป ☑ ตัว U ☐ ตัว V กว้างประมาณ เมตร

ระดับตลิ่งฝั่งซ้าย 41.887 ม.(ร.ท.ก.) มีลักษณะ

ระดับตลิ่งฝั่งขวา 41.877 ม.(ร.ท.ก.) มีลักษณะ

6. ความลาดชัน :

7. ความสูงท้องน้ำเทียบกับระดับน้ำทะเล 29.715 ม.(ร.ท.ก.)

8.สิ่งกีดขวาง

☐	เหมือง	อยู่			แนวสำรวจ		เมตร
☑	ฝาย	อยู่		เหนือ	แนวสำรวจ	15080	เมตร
☐	เขื่อน	อยู่			แนวสำรวจ		เมตร
☐	อื่นๆ						





ภาพแสดงรูปตัดขวางลำน้ำ

9. หมุดหลักฐาน	☐ **ชั่วคราว**	☑ **ถาวร**	**ชนิด**	**แท่งปูนกลม**	**ขนาด**	**10*10**
ตั้งอยู่ที่	สะพาน				ฝั่ง	ซ้าย
ราคา		สถานที่ใกล้เคียง				



10. การโยงราคาระดับเป็น ร.ท.ก.

จากหน่วยงาน อำเภอ

จังหวัด

ราคาที่โยงจากหน่วยงาน ม.(ร.ท.ก.) เมื่อวันที่


11. เสาระดับน้ำ จำนวน 4 ต้น รวม 8 เมตร

ต้นที่ 1 เป็น	เสาไม้	ติดแผ่น	1	เมตร	ถึง	2	เมตร	ทาสี	ขาว
ต้นที่ 2 เป็น	เสาปูน	ติดแผ่น	3	เมตร	ถึง	4	เมตร	ทาสี	ขาว
ต้นที่ 3 เป็น	เสาปูน	ติดแผ่น	5	เมตร	ถึง	6	เมตร	ทาสี	ขาว
ต้นที่ 4 เป็น	เสาปูน	ติดแผ่น	7	เมตร	ถึง	8	เมตร	ทาสี	แดง
ต้นที่ 5 เป็น		ติดแผ่น		เมตร	ถึง		เมตร	ทาสี	

<u>หมายเหตุ</u>(เสาไม้ใช้ขนาด 6”x 6” หรือ 6”x 8” , เสาคลส. 0.15 x 0.20 ม.)

12. แผ่นระดับติดตอม่อสะพาน

ตอม่อที่ 1 ติดแผ่น	เมตร	ถึง		เมตร
ตอม่อที่ 2 ติดแผ่น	เมตร	ถึง		เมตร
ตอม่อที่ 3 ติดแผ่น	เมตร	ถึง		เมตร

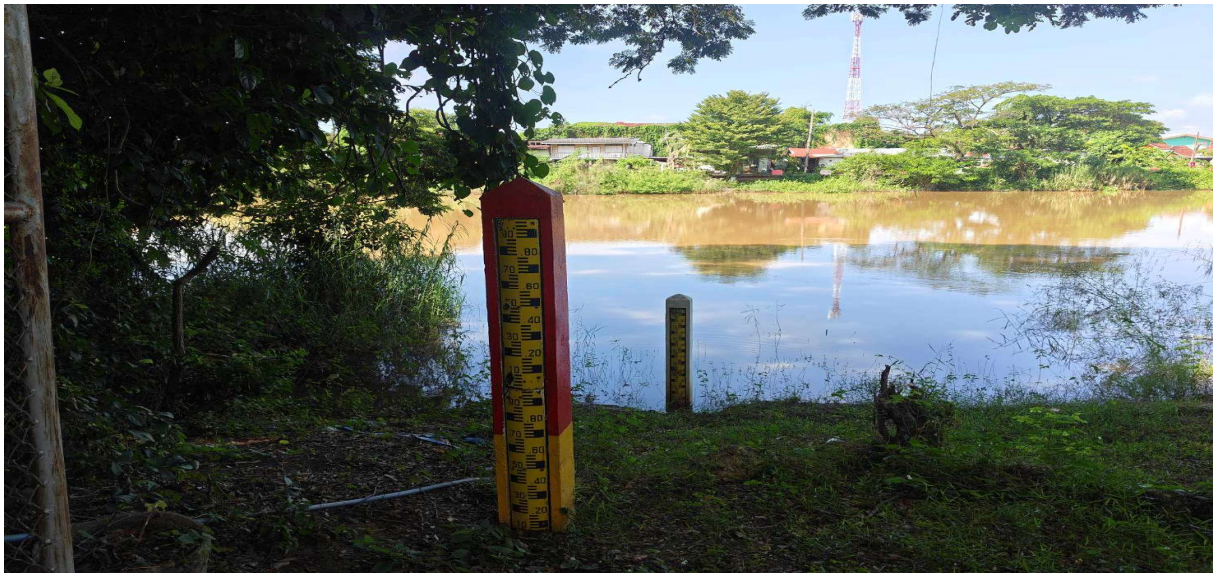

ภาพแผ่นระดับน้ำ

13. ศูนย์เสาระดับ **ราคา** 31.490 ม.(ร.ท.ก.)

14. เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ

ยี่ห้อ		หมายเลข	No.
ติดตั้งเมื่อ	เดือน		พ.ศ.

15. เริ่มทำการสำรวจระดับน้ำเมื่อ พ.ศ.

16. เครื่องมือตรวจวัดทางโทรมาตร						
ลำดับ	รายงาน	จำนวน	หน่อย	ยี่ห้อ	รุ่น	S/N
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						



17. พนักงานอ่านระดับน้ำ ชื่อ

บ้านเลขที่ - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด -

รหัสไปรณีย์ - หมายเลขโทรศัพท์ -

เลขบัญชีธนาคาร -

18. บ้านพนักงาน อยู่ห่างจากสถานีประมาณ - เมตร

19. เริ่มทำการสำรวจปริมาณน้ำเมือ -

แบบหน่วย ☐ประจำ ☑เคลื่อนที่

20. เริ่มทำการสำรวจอุตุเมื่อ -

21. ขนาดของคอกอุตุ กว้าง - เมตร___ ยาว - เมตร


ประกอบด้วย

22. บ้านพักและที่ทำการ ☐ เช่า ☐ ปลูกสร้าง

ลักษณะ ☐ ชั้นเดียว ☐ สองชั้น

เช่าเมื่อ เลขที่

ปลูกสร้างเมื่อ เลขที่



รูปบ้านพักและที่ทำการ

ผู้บันทึก .....นาย ณรงค์ รอดคง.....

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
